茨建技管試 第 03856 号

2024年10月10日

根崎解体工事㈱

殿

一般財団法人　茨城県建設技術管理センター　理事長

建設工事 材料 試験結果報告書

ご依頼の建設工事材料試験結果は別紙のとおりで

ありますのでご報告いたします。

工　事　名

品質管理　ＲＢ－４０

工 事 場 所

－　－　－

試料採取箇所

－　－　－

試 験 項 目

1）骨材のふるい分け試験	1 件
2）骨材のＣＢＲ試験	1 件
3）コンクリート再生砕石の異物混入割合試験	1 件

注１）試験品目のサンプリング・搬入は、依頼者による。

注２）工事名・工事場所・試料採取箇所については、試験依頼書の記載内容による。

注３）この試験結果は、依頼者より受領したサンプルの特性値のみを表す。

受 付 番 号 ： 03327

受付番号	03327	1 / 1

JIS A 1102

骨材のふるい分け試験

受付年月日	2024年 09月 13日	試験年月日	2024年 09月 24日
試料名 又は 試料状態	RB-40	試料番号	

試 験 項 目 名	試 験 値
17回CBR (%)	47.05
異物混入割合 (%)	0
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊混入割合 (%)	0

粒径 mm	残留率 %	加積通過率 %
53		
37.5	0.0	100.0
19	37.3	62.7
4.75	33.5	29.2
2.36	11.1	18.1
>	18.1	
計	100.0	

摘要	↕	茨城県土木部品質規格値

×印は100%通過規格を示す

粒 度 曲 線

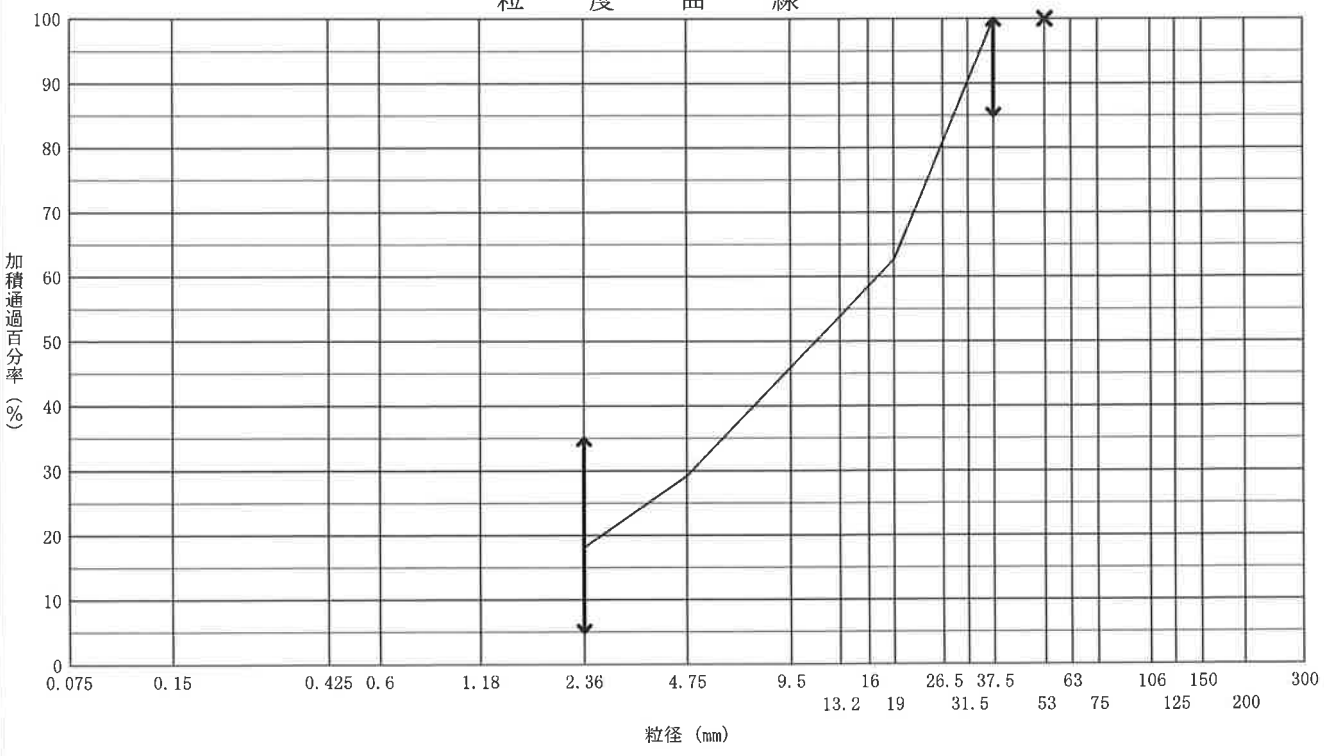

試験者	平野 弘信

一般財団法人 茨城県建設技術管理センター

受付番号	03327	1／1

締固めた土のＣＢＲ試験

受付年月日	2024年 09月 13日	試験年月日	2024年 10月 04日

試料名又は試料状態
RB-40

試料番号

試験条件又は養生条件
水浸

試料の含水比	11.2	%
17回3層の乾燥密度	1.66	Mg/m^3
17回3層のＣＢＲ	47.05	%

供試体作製

突固め回数	湿潤+モールド質量 g	モールド質量 g	湿潤供試体質量 g	モールド体積 mm^3	湿潤密度 ρ_t Mg/m^3	乾燥密度 ρ_d Mg/m^3
92回3層						
42回3層						
17回3層	8099	4023	4076	2209×10^3	1.85	1.66
67回3層						

含水比測定

ma	4288	mb	3930	mc	734	w=	11.2	%	平均含水比 11.2 %
ma		mb		mc		w=		%	

貫入量 mm		0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	5.0	7.5	
荷重 kN	92回								
	42回								
	17回	1.145	1.947	2.851	3.604	4.572	9.363	13.565	
	67回								

ＣＢＲ　　標準荷重 19.9 kN

ＣＢＲ %	92回3層	42回3層	17回3層	67回3層
			47.05	

備考

試験者	平野　弘信

一般財団法人　茨城県建設技術管理センター

受付番号	03327	1 ／ 1

コンクリート再生砕石中の異物とアスファルト塊の混入量試験

受付年月日	2024年 09月 13日	試験年月日	2024年 09月 24日
試料名 又は 試料状態	RB-40	試料番号	

異　物　の　種　類	混　合　割　合　%
鉄類	0
ガラス	0
木片	0
レンガ	0
陶器	0
プラスチック	0
異物混入割合合計	0
アスファルト塊混入割合	0

※試料は4.75mm以上とする。

試験者	平野　弘信

一般財団法人　茨城県建設技術管理センター
